BV: Gebäudeneubau / Bauherr: Max Mustermann

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Ausschreibung Rückbau Fundamente	2 Tage	Do 16.04.15	Fr 17.04.15
2	Ausschreibung Rückbau Fassadenverkleidung	1 Tag	Mo 20.04.15	Mo 20.04.15
3	Ausschreibung Erdarbeiten, Grundleitungen, Rohbau	7 Tage	Di 21.04.15	Mi 29.04.15
4	Stellen der Anträge Stadtwerke	1 Tag	Di 07.04.15	Di 07.04.15
5	Stellen der Anträge Straßensperrung	1 Tag	Do 16.04.15	Do 16.04.15
6	Auswertung und Vergabe Erdarbeiten + Rohbau	3 Tage	Do 14.05.15	Mo 18.05.15
7	Erteilung der Baugenehmigung	1 Tag	Mo 30.03.15	Mo 30.03.15
8	Straßensperrung Gehweg + Parkstreifen	1 Tag	Mi 06.05.15	Mi 06.05.15
9	Rückbauarbeiten Fundamente	5 Tage	Mo 11.05.15	Fr 15.05.15
10	Vermessungsarbeiten / Baubeginn	2 Tage	Mo 01.06.15	Di 02.06.15
11	Baugrubenaushub	5 Tage	Mi 03.06.15	Di 09.06.15
12	Grundleitungen + SW / RW Anschlüsse	3 Tage	Mi 10.06.15	Fr 12.06.15
13	Erdarbeiten / Grundleitungen	3 Tage	Mo 15.06.15	Mi 17.06.15
14	Lieferung / Einbau der Mehrsparteneinführung	1 Tag	Do 18.06.15	Do 18.06.15
15	Erstellung der Betonsohle + Fundamente	3 Tage	Fr 19.06.15	Di 23.06.15
16	Erstellung Baustrom + Bauwasseranschluß	2 Tage	Mi 24.06.15	Do 25.06.15
17	Geländeprofilierung des Grundstückes	2 Tage	Fr 26.06.15	Mo 29.06.15
18	Maurerarbeiten EG	10 Tage	Di 30.06.15	Mo 13.07.15
19	Gerüstaufbau Erdgeschoß	1 Tag	Di 14.07.15	Di 14.07.15
20	Decke EG + Treppe EG+ Balkon+Betonfertigteile	5 Tage	Mi 15.07.15	Di 21.07.15
21	Maurerarbeiten 1.OG	10 Tage	Mo 27.07.15	Fr 07.08.15
22	Gerüstaufbau 1. Obergeschoß	1 Tag	Mo 10.08.15	Mo 10.08.15
23	Decke 1.OG + Treppe	5 Tage	Di 11.08.15	Mo 17.08.15
24	Maurerarbeiten 2.OG	10 Tage	Fr 21.08.15	Do 03.09.15
25	Gerüstaufbau 2. Obergeschoß	1 Tag	Fr 04.09.15	Fr 04.09.15
26	Ringanker über dem 2.OG	10 Tage	Mo 07.09.15	Fr 18.09.15
27	Lieferung und Richten vom Dachstuhl	4 Tage	Do 24.09.15	Di 29.09.15
28	OSB Dachschalung liefern und verlegen	2 Tage	Mi 30.09.15	Do 01.10.15
29	Lieferung und Montage Schornstein	3 Tage	Fr 02.10.15	Di 06.10.15
30	Dachdecker- und Klempnerarbeiten	5 Tage	Mi 07.10.15	Di 13.10.15
31	Fenstermontage	3 Tage	Mi 14.10.15	Fr 16.10.15
32	Außenputzarbeiten	20 Tage	Mo 19.10.15	Fr 13.11.15
33	Fassadenarbeiten / Riemchen + Verfugung	15 Tage	Mo 16.11.15	Fr 04.12.15
34	Gerüstdemontage	1 Tag	Mo 07.12.15	Mo 07.12.15
35	Vorinstallation Heizung + Sanitär	7 Tage	Mo 16.11.15	Di 24.11.15
36	Vorinstallation Elektro	7 Tage	Mo 16.11.15	Di 24.11.15
37	Trockenbauarbeiten DG	3 Tage	Mi 25.11.15	Fr 27.11.15
38	Innenputzarbeiten	8 Tage	Mo 30.11.15	Mi 09.12.15
39	Fußbodendämmung verlegen	2 Tage	Di 15.12.15	Mi 16.12.15
40	Fußbodenheizung verlegen	3 Tage	Do 17.12.15	Mo 21.12.15
41	Estricharbeiten	3 Tage	Di 22.12.15	Do 24.12.15
42	Trockenbauarbeiten Wände	5 Tage	Fr 25.12.15	Do 31.12.15
43	Trocknungsphase Estrich	20 Tage	Fr 01.01.16	Do 28.01.16
44	Montage Sektionaltor	2 Tage	Di 08.12.15	Mi 09.12.15
45	Hochheizen Fußbodenheizung	5 Tage	Fr 29.01.16	Do 04.02.16
46	Lieferung und Einbau Kamin	4 Tage	Fr 05.02.16	Mi 10.02.16
47	Montage Sanitärobjekte	14 Tage	Fr 29.01.16	Mi 17.02.16
48	Montage Elektrobauteile	14 Tage	Fr 29.01.16	Mi 17.02.16
49	Fliesenlegerarbeiten	14 Tage	Fr 05.02.16	Mi 24.02.16
50	Malerarbeiten	21 Tage	Fr 08.01.16	Fr 05.02.16
51	Fußbodenbelagsarbeiten	5 Tage	Do 25.02.16	Mi 02.03.16
52	Belagsarbeiten Treppen	5 Tage	Do 03.03.16	Mi 09.03.16
53	Montage Innentüren	2 Tage	Do 10.03.16	Fr 11.03.16
54	Endmontage Heizung +Sanitär	2 Tage	Do 03.03.16	Fr 04.03.16
55	Küchenmontage	3 Tage	Do 03.03.16	Mo 07.03.16
56	Endreinigung	2 Tage	Mo 07.03.16	Di 08.03.16
57	Einzug	2 Tage	Mi 09.03.16	Do 10.03.16
58	Mängelbeseitigung	5 Tage	Mo 07.03.16	Fr 11.03.16

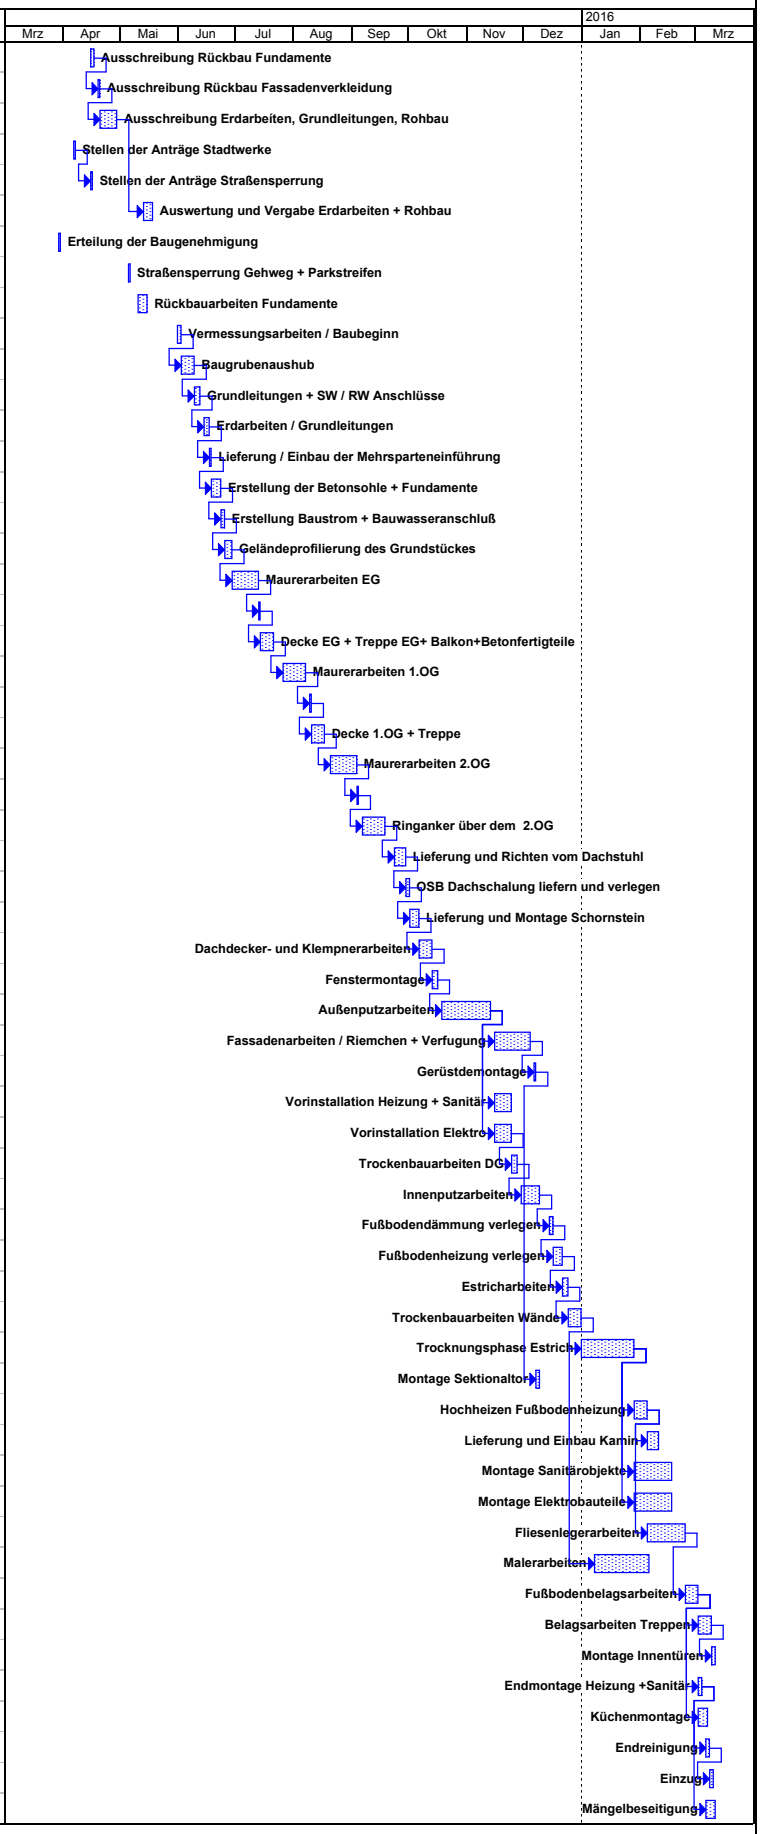

Bearbeiter: Herr Brinker
